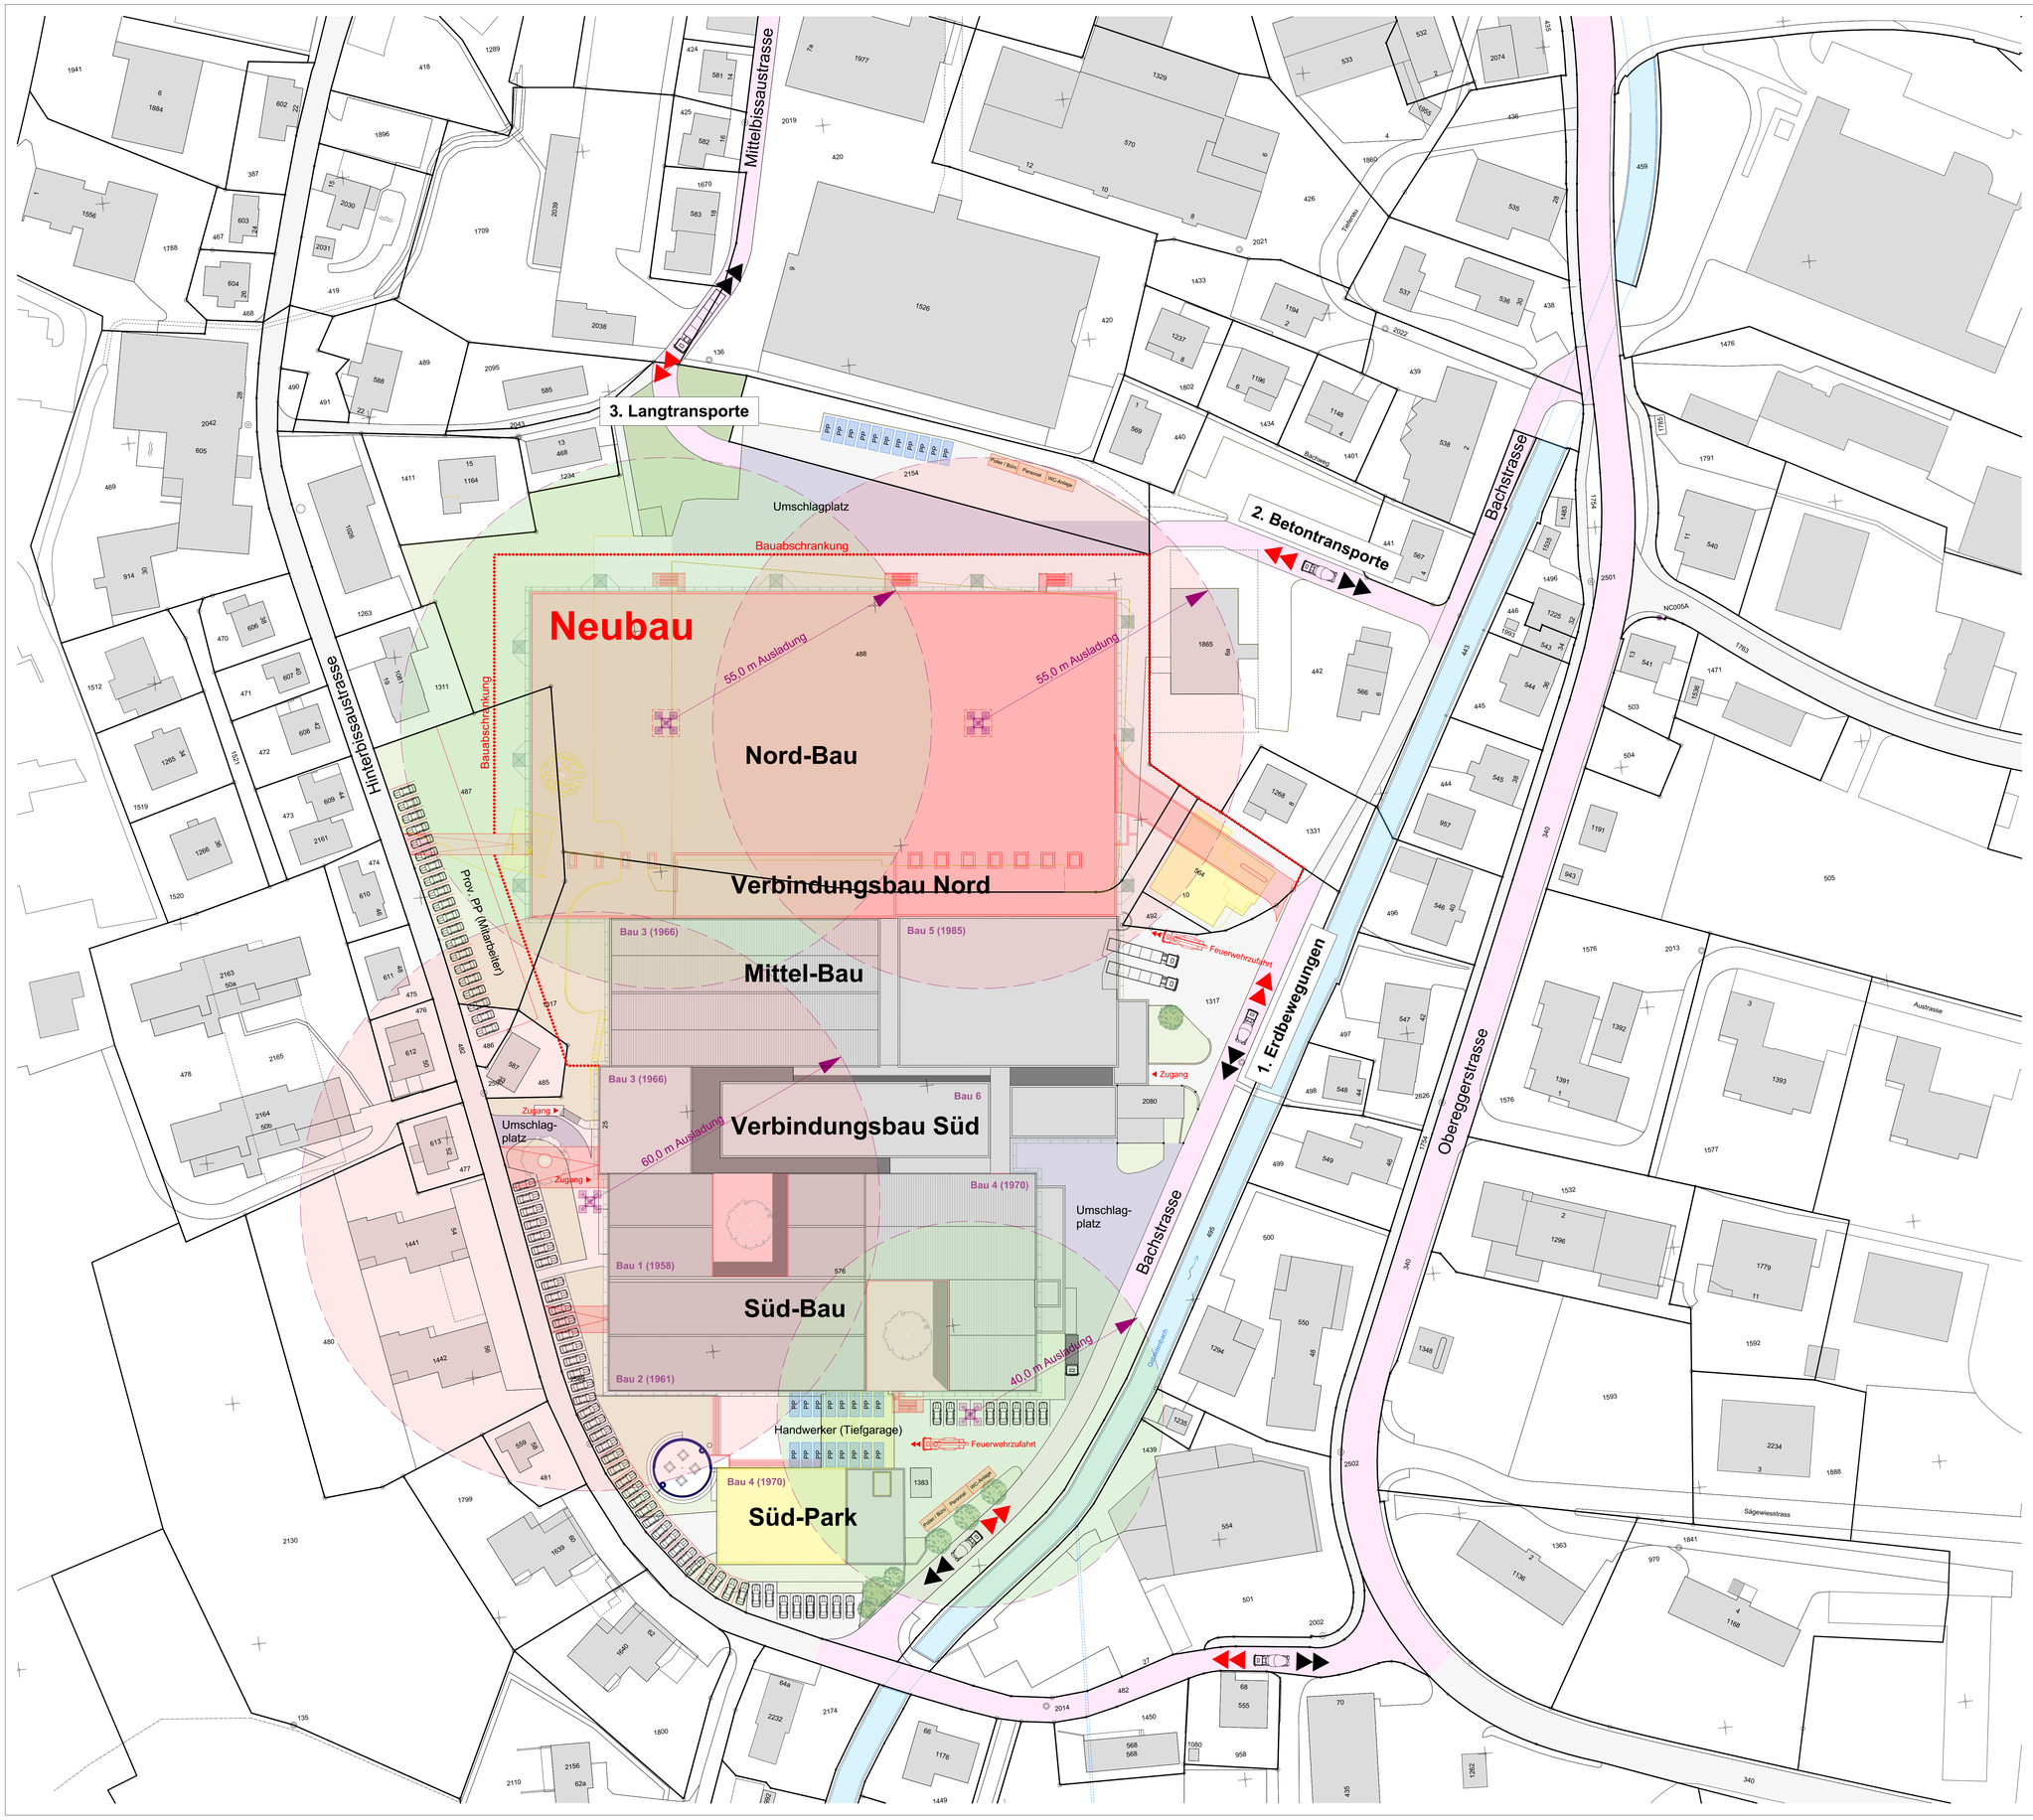

Baustellenzufahrt
Die Baustellenzu- und Wegfahrt ist über die Obereggerstrasse via Bachstrasse vorgesehen. Anlieferungen über die Hinterbissaustrasse (Tempo 30, Schulweg) sind untersagt. Die Baustellenzufahrt kreuzt sich beim Einlenker zur Bachstrasse mit dem Schulweg, dort ist besondere Vorsicht geboten und wenn nötig Sicherheitsmassnahmen zu treffen.

1. Erdbewegungen Sämtliche Erdbewegungen sind über die Anlieferung der Sefar zu transportieren.

2. Betonlieferungen Sämtliche Betonlieferungen sind über den ersten Einlenker zur Bachstrasse vorgesehen.

3. Langtransporte Einzelne Kran- und Langtransporte sind über die Mittelbissaustrasse mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen (Wohnquartier, Schulweg) vorgesehen.

Güterumschläge
Grosstransporte und Anlieferungen sind nur vorwärts gestattet. Rückwärtsfahrten müssen zwingend mittels Hilfspersonal (vor und hinter dem Güterumschlag) gesichert werden.

Legende:

- Fussgängerzone
- Umschlagplatz LKW
- Zwischenlager, Lagerpritschen
- Fassadengerüst
- Podeste / Gerüstplattform
- Handwerker-Parkplätze
- Baustellenzu- und wegfahrt
- Baustellenwegfahrt LKW's
- Absperrlatten rot/weiss
- Absperrgitter
- Geschlossene Bauwand
- Baucontainer

Die Bauherrschaft ..... , ...

Die Grundeigentümer ..... , ...

Der Planverfasser ..... , ...

Sefar AG, Hinterbissaustrasse 25, 9410 Heiden
Umbau und Erweiterung Sefar-Radix, Hinterbissaustrasse 25, 9410 Heiden

BAULOGISTIK
BAUSTELLENINSTALLATION
VORABZUG

Plan No	2502.01
Mst	1 : 500
Datum	16.06.2025
Rev	27.10.2025
Form	A0

BAUKOM

Baukom AG
Feldlistrasse 31a
CH-9000 St. Gallen

Büro für Management und Ökonomie im Bauwesen

T +41 71 245 90 10
F +41 71 245 90 15

info@baukom.ch
www.baukom.ch
